

PROJET ETSIA

« YANSNET – PARTIE APPLICATION »

PLAN PROJET

GROUPE PROJET 15

MAKONGNE DEFFO July Merveille

NANKAP NDIZEU Loic Aurel

NKOULOU Joseph Emmanuel

NOUNGOUA NOUNGOUA Teddy Steven

TOFA DEFFO Lionel Junior

Promotion X202

Sommaire

I. Rappel sur le contexte.....	4
II. Gestion de la portée	4
Périmètre inclus/exclu	4
WBS (Work Breakdown Structure)	5
Contrôle des évolutions du périmètre	6
III. Gestion de la durée	6
IV. Gestion des coûts.....	7
1) Note de synthèse executive (executive summary)	7
2) Analyse macro et micro-économique (diagnostic stratégique)	8
2.a) Analyse de l'environnement de Yansoki	8
2.b) La Psychologie de l'Utilisateur Étudiant.....	9
3) Le modèle économique (la mécanique de la rentabilité)	10
Pilier 1 : La Régie Publicitaire Hyper-Locale (L'Océan Bleu du Commerce)	10
Pilier 2 : Le Recrutement Corporate et la Chasse de Tête	11
Pilier 3 : L'Acquisition Bancaire et Financière (L'Affiliation CPA)	12
Pilier 4 : La Data Qualifiée et la Business Intelligence	12
4) Architecte technique et rationalisation des coûts.....	13
4.1) L'Infrastructure Serveur Zéro Franc (Exploitation des Actifs Locaux).....	13
4.2. Le Bouclier Algorithmique : L'API AWS Rekognition.....	13
5.2) Année 2 et 3 : Scalabilité et Remboursement Intégral	15
6) PLAN D'EXÉCUTION	16
6.1) Stratégie du "Verrouillage de Marché" (Lock-In Effect).....	16
6.2) Chronogramme de Lancement Échelonné	16
7) Conclusion générale et appel à la décision	18
V. Gestion de la qualité	20
1.Niveau application.....	20
1.1Qualité et sécurité des données.....	20
1.2 Qualité des performances.....	20

1.3 Qualité technique système	21
1.4 Qualité fonctionnelle.....	21
1.5 Qualité de l'application mobile.....	22
2.Niveau livrable	23
2.1 Cheklist.....	23
2.2 Matrice de critères de validation par livrable	23
VI. Gestion des ressources humaines	24
VII. Gestion des communications.....	25
VIII.Gestion des parties prenantes.....	26
IX. Gestion des risques.....	27
Registre des risques et plan de réponse.....	27
Matrice des risques	27
X. Gestion de l'approvisionnement	28
Besoins matériels et logiciels.....	28
Contraintes et delais d'approvisionnement.....	29
XI. Gestion du changement.....	29
Processus de gestion du changement	29
XII. Gestion de l'intégration.....	30
Vision et objectifs du projet	30
Tableau de bord de pilotage – Coherence des sections	31

I. Rappel sur le contexte

Le projet YANSNET vise à créer un écosystème numérique interconnecté pour les étudiants du campus UCAC-ICAM de Yansoki, Douala – Cameroun. L'infrastructure permet de relier les residences étudiantes (minicités) distribuées autour du campus à un serveur central hébergeant une application de reseau social local.

II. Gestion de la portée

La gestion de la portée définit les limites précises du projet **YANSNET** afin de garantir le respect des délais très courts (une semaine) et des ressources allouées. Ce volet détaille les **inclusions**, centrées sur les fonctionnalités vitales du MVP telles que l'authentification sécurisée, le fil d'actualité et la messagerie locale, ainsi que les **exclusions** stratégiques, comme le module Alumni ou le monitoring 24/7, reportés en version 2.

Pour structurer techniquement ce périmètre, nous utilisons un **WBS (Work Breakdown Structure)** ou Organigramme Technique de Produit. Ce dernier décompose le projet en lots de travaux gérables (Développement, Infrastructure, Sécurité, Documentation), permettant ainsi une vision hiérarchique claire des livrables nécessaires à la validation finale par le jury et le partenaire.

Périmètre inclus/exclu

INCLUS dans la V2	EXCLUS DE LA V2
Correction de toutes les anomalies bloquantes identifiées dans le bilan MVP (SSO/AD, RBAC, censure, PRA, chiffrement au repos).	Refonte complete de l'architecture backend – evolution incrémentale uniquement.
Module Alumni et canaux COCFET avec profil alumni distinct.	Application web (desktop) – la V2 reste une application mobile iOS/Android.
Système de localisation géographique des publications (optionnel, consentement).	Système de paiement ou de commerce en ligne entre étudiants.
Connexion multi-appareils (maximum 3 sessions simultanées).	Integration avec des systemes extérieurs à l'UCAC-ICAM (autres universités).
Moteur de recherche avance (publications, utilisateurs, groupes, evenements).	Streaming video en direct (Live).

Reactions enrichies, partage de publications, signalement ameliore.	Messagerie vocale ou appels audio/video.
Stories et contenus ephemerres (24h).	Traduction automatique des publications.
Agenda etudiant et evenements UCAC-ICAM avec notifications.	Authentification biometrique.
Module IA d'analyse sentimentale (avec validation ethique prealable).	Publicite ou contenu sponsorise.
Systeme d'alerte SOS via reseau LAN de Yansoki.	Connexion sur navigateur web par les etudiants.
Deploiement OTA, mode hors-ligne complet, PRA valide.	Toute fonctionnalite non specifiee dans le SRS V2.

WBS (Work Breakdown Structure)

Le WBS décompose l'ensemble du projet YANSNET V2 en lots de travaux hiérarchisés.

Niveau 1	Niveau 2 – Lot de travaux	Niveau 3 – Activités principales
1. Gestion du Projet	1.1 Planification	Plan projet, GANTT, PERT, budget, matrice RACI, registre des risques
	1.2 Suivi et pilotage	Réunions Quotidienne, comptes rendus, tableau de bord, rapports d'avancement
	1.3 Clôture	Rapport final, rétrospective, archivage des livrables
2. Correction MVP	2.1 Sécurité et authentification	Intégration SSO/AD, RBAC, chiffrement au repos, pentest
	2.2 Performance et infrastructure	Optimisation fil d'actualité, pipeline vidéo, mode LAN, PRA
	2.3 Modération	Modèle de censure V2, interface modérateur, journaux d'audit
3. Nouvelles Fonctionnalités.	3.1 Module Alumni / COCFET	Profil alumni, canal COCFET, annuaire des diplômes
	3.2 Fonctionnalités sociales	Localisation, multi-appareils, réactions, stories, agenda, recherche avancée
	3.3 Module IA	Modèle d'analyse sentimentale, alertes bien-être, tableau de bord veille
	3.4 Système SOS LAN	Bouton SOS, transmission LAN, tableau de bord sécurité, tests de résilience
4. Infrastructure	4.1 Scalabilité	Tests de charge (125k utilisateurs), auto-scaling, monitoring 24/7
	4.2 Déploiement	Pipeline CI/CD, déploiement OTA progressif, rollback automatique

5. Tests et Qualité	5.1 Tests techniques	Tests unitaires ($\geq 70\%$ couverture), intégration, système
	5.2 Tests d'acceptation	UAT avec panel de 24 bêta-testeurs, rapport UAT
6. Documentation	6.1 Documentation technique	Architecture, dictionnaire de données, MCD, BPMN, guide de déploiement
	6.2 Documentation projet	Plan projet, comptes rendus, rapport final, guide utilisateur

Contrôle des évolutions du périmètre

Etape	Description	Responsable	Delai de traitement
1. Demande	Soumission d'une demande de changement via le formulaire normalisé.	Tout membre de l'équipe	Immédiate
2. Analyse d'impact	Evaluation de l'impact sur le périmètre, le planning, le budget et la qualité.	Chef de projet	48 h maximum
3. Validation	Approbation ou refus par le partenaire (Père BOSSOU Maximilien).	Partenaire	72 h maximum
4. Intégration	Mise à jour du SRS V2, du WBS, du GANTT et du registre des changements.	Chef de projet	Après validation
5. Communication	Notification à toutes les parties prenantes de la modification acceptée.	Chef de projet	Immédiate après intégration

III. Gestion de la durée

La maîtrise du calendrier est le pivot central de la réussite de **YANSNET**, particulièrement face aux échéances rigoureuses du cycle ETSIA. Ce volet structure notre progression temporelle à travers un **diagramme de GANTT**, qui segmente le projet en phases logiques et identifie les jalons critiques comme la validation du SSO ou la mise en service du serveur local.

Pour sécuriser ces étapes, nous utilisons un **réseau PERT** et une **matrice des dépendances**, outils indispensables pour isoler le **chemin critique** : l'enchaînement de tâches dont le moindre retard impacterait directement la date de soutenance. Enfin, le suivi de l'avancement repose sur des revues techniques hebdomadaires (Sprints), permettant d'ajuster le planning en temps réel et de garantir une livraison conforme aux attentes du partenaire dans les délais impartis.

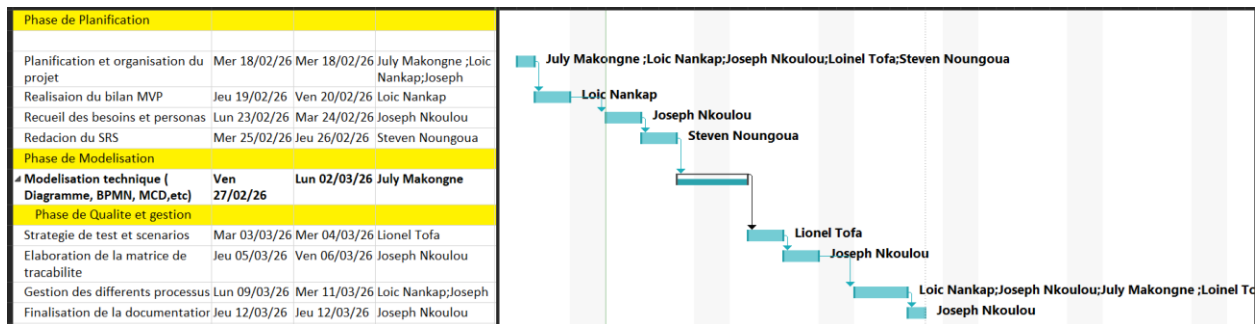


Diagramme de GANTT

IV. Gestion des coûts

1) Note de synthèse executive (executive summary)

Le marché des technologies universitaires en Afrique subsaharienne, et particulièrement au Cameroun, souffre d'un paradoxe alarmant et contre-productif. D'un côté, nos étudiants, futurs ingénieurs de l'élite formés à l'UCAC-ICAM, maîtrisent et utilisent quotidiennement les technologies algorithmiques les plus avancées du monde (Intelligence Artificielle générative, plateformes de streaming haute définition, réseaux sociaux mondialisés à flux continus). D'un autre côté, la gestion de leur vie quotidienne sur le campus, leur sécurité physique et leur intégration socio-académique restent figées dans des méthodes d'un autre siècle.

À l'UCAC-ICAM, et plus spécifiquement dans la zone en pleine expansion de Yansoki, la communication institutionnelle et estudiantine est non seulement fragmentée, mais elle est en crise. L'administration et les instances représentatives s'épuisent à diffuser des informations cruciales qui se diluent inévitablement. Ces données vitales sont dispersées entre des dizaines de groupes WhatsApp non officiels (où les fausses rumeurs et le bruit numérique prolifèrent de manière incontrôlable), des affichages papier qui coûtent cher en consommables, s'abîment avec le climat et que la génération Z ne lit plus, et enfin des e-mails institutionnels souvent noyés dans les spams ou ignorés.

Le projet YANSNET ne se contente pas de proposer une simple rustine numérique ou un énième portail web sans âme. YANSNET est conceptualisé comme une véritable « Super-App » institutionnelle, un hub centralisé et immersif qui a pour ambition stratégique de capturer et de retenir 100% de l'attention numérique des étudiants de l'Institut.

2) Analyse macro et micro-économique (diagnostic stratégique)

2.a) Analyse de l'environnement de Yansoki

Le déploiement d'une solution technologique ne se fait pas dans le vide. Elle doit répondre aux contraintes et aux opportunités de son écosystème immédiat. L'analyse ci-dessous justifie l'urgence du déploiement de YANSNET dans le campus de Yansoki :

- **Facteurs Politiques et Institutionnels** : L'UCAC-ICAM se positionne comme un leader de l'enseignement supérieur technologique en Afrique Centrale. Il est politiquement incohérent pour une institution formant des ingénieurs informatiques de pointe de ne pas posséder son propre écosystème logiciel interne souverain. YANSNET renforce l'image de marque et le prestige politique de l'institution face aux universités concurrentes.
- **Facteurs Économiques** : Le contexte inflationniste mondial touche durement le Cameroun. Le pouvoir d'achat étudiant est extrêmement limité. Imposer une application payante serait une erreur stratégique fatale (taux d'adoption proche de 0%).

YANSNET contourne ce problème par sa gratuité totale pour l'étudiant, transférant la charge financière sur les acteurs B2B (entreprises, commerces locaux) qui, eux, disposent de budgets marketing conséquents cherchant désespérément à cibler cette tranche d'âge.

- **Facteurs Technologiques** : Le taux d'équipement en smartphones chez les étudiants de l'UCAC-ICAM frôle les 98%. La couverture 4G autour de Yansoki est stable, et le campus dispose d'un réseau Wi-Fi. Les barrières matérielles n'existent plus. L'enjeu est purement logiciel : il faut fournir la bonne application optimisée pour consommer très peu de données (d'où l'importance de notre architecture bridée).
- **Facteurs Environnementaux** : La communication papier (flyers, affiches) est un désastre écologique et financier. En digitalisant 100% des annonces des clubs étudiants, de l'administration et des commerces locaux, YANSNET s'inscrit dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et Green IT, réduisant drastiquement l'empreinte carbone du campus.
- **Facteurs Légaux (Cybersécurité)** : Le Cameroun dispose d'un cadre légal strict sur la cybersécurité et la diffamation en ligne. L'école peut être tenue responsable si des contenus illicites circulent sur ses propres réseaux. YANSNET, grâce à son intelligence artificielle de modération algorithmique, offre un bouclier légal absolu en bloquant les contenus inappropriés avant même leur publication.

2.b) La Psychologie de l'Utilisateur Étudiant

Comprendre l'étudiant est la clé de la rétention. Pourquoi un étudiant ouvrirait-il YANSNET 10 fois par jour ? Parce que nous appliquons le modèle du « Hook » (l'accroche) défini par Nir Eyal dans la Silicon Valley.

L'étudiant reçoit un déclencheur (Notification : 'Vos notes d'algorithmique sont disponibles' ou 'Alerte : Promotion flash à la cafétéria'). Il effectue une action simple (ouvrir l'application). Il reçoit une récompense variable (la note espérée, le menu du jour, une photo d'un ami). Enfin, il investit dans l'application (en likant, en commentant, en postant

son propre contenu). C'est ce cycle neurologique, basé sur la dopamine, qui garantira un taux d'utilisation quotidien (DAU - Daily Active Users).

3) Le modèle économique (la mécanique de la rentabilité)

La question fondamentale de toute innovation technologique est sa monétisation à long terme : comment transformer une audience captive en revenus pérennes et durables ? Le modèle économique de YANSNET est un chef-d'œuvre d'ingénierie financière. Il repose sur la gratuité absolue pour l'étudiant, compensée par une monétisation agressive et ultra-ciblée envers les acteurs économiques externes. C'est le principe de la Plateforme Multilatérale B2B.

Pour utiliser une analogie architecturale pertinente : imaginez YANSNET comme un centre commercial exclusif, ultra-sécurisé, réservé à l'élite intellectuelle du pays. Nous ne ferons jamais payer le ticket d'entrée aux visiteurs. En revanche, nous allons facturer à un prix premium le droit de présence (le loyer) des marques et entreprises qui veulent désespérément avoir accès à ces visiteurs qualifiés. Voici l'analyse approfondie des 4 piliers de revenus :

Pilier 1 : La Régie Publicitaire Hyper-Locale (L'Océan Bleu du Commerce)

Le Diagnostic : Analysons finement la zone de Yansoki et sa périphérie. C'est le cœur d'une micro-économie extrêmement dynamique, foisonnante et en pleine mutation : résidences universitaires, fast-foods, secrétariats, pressings, salles de sport et réseaux de transports (motos-taxis). Aujourd'hui, ces acteurs souffrent d'une asymétrie d'information critique.

S'ils impriment des flyers promotionnels, le coût unitaire est élevé, la distribution est laborieuse, et le taux de conversion est inférieur à 1% (la majorité finit à la poubelle). S'ils paient des publicités numériques globales (Facebook Ads, Google Ads), les algorithmes généralistes montreront leurs annonces à des habitants de Bonabéri ou Yaoundé qui ne traverseront jamais la ville pour un repas étudiant. C'est une hémorragie financière pour eux.

La Solution YANSNET : YANSNET résout ce problème structurel en offrant le « Ciblage Géographique Parfait et Certifié ». Nous garantissons mathématiquement à l'annonceur que 100% des personnes voyant sa publicité sont des étudiants de l'UCAC-ICAM. Nous allons commercialiser des abonnements d'espaces publicitaires (Native Ads intégrées naturellement dans le fil d'actualité, non intrusives) à un tarif très compétitif de 10 000 FCFA par mois. C'est un monopole d'attention absolu. Convaincre 50 commerces de Yansoki de souscrire à cet outil de survie commerciale génère mécaniquement 500 000 FCFA de revenus mensuels automatiques, couvrant instantanément tous les frais opérationnels.

Pilier 2 : Le Recrutement Corporate et la Chasse de Tête

Le Diagnostic : Les multinationales et grandes entreprises camerounaises (MTN, Orange, SABC, Afriland First Bank, TotalEnergies, etc.) engagent des dépenses pharaoniques pour identifier, séduire et recruter les meilleurs ingénieurs dès leur sortie de l'UCAC-ICAM. Ce processus implique de payer des agences de recrutement onéreuses, d'organiser des salons physiques coûteux et de traiter manuellement des piles de CV non formatés.

La Solution YANSNET : YANSNET inverse totalement ce paradigme logistique. Au fur et à mesure que les étudiants publieront sur YANSNET leurs réalisations académiques, leurs projets associatifs, leurs compétences en code ou en mécanique, notre base de données se transformera en un vivier de talents structuré, vivant et infiniment précieux.

Nous mettrons en place une interface B2B. Nous commercialiserons des licences logicielles « Recruteurs Premium » aux Départements des Ressources Humaines (exemple : 1 000 000 FCFA par an par entreprise). Cette licence octroiera un accès privilégié à un moteur de recherche interne permettant de filtrer les étudiants par année, filière et spécialité, et de leur envoyer des offres de stage ou d'emploi en message direct. Nous monétisons l'accès exclusif à l'intelligence de notre institution.

Pilier 3 : L'Acquisition Bancaire et Financière (L'Affiliation CPA)

Le Diagnostic : Dans le secteur bancaire, la LTV (Life-Time Value, ou Valeur Vie Client) d'un étudiant ingénieur est l'une des plus élevées du marché. L'étudiant fauché d'aujourd'hui est le cadre supérieur à haut revenu de demain. Les banques se livrent une guerre impitoyable pour capter ces profils le plus tôt possible. Toutefois, la réglementation limite le démarchage agressif sur les campus physiques.

La Solution YANSNET : YANSNET proposera un partenariat d'exclusivité stratégique à une seule banque (ou institution de micro-finance de premier plan). Nous intégrerons un module natif 'Finances Étudiantes' au sein de l'application.

Étant donné que l'identité de l'étudiant est pré-certifiée par son inscription à l'école, il pourra initier l'ouverture d'un compte bancaire de premier équipement, ou solliciter un micro-crédit (pour l'achat d'un ordinateur portable, par exemple) en moins de 3 clics.

C'est le modèle de l'Affiliation au Coût Par Acquisition (CPA). La banque partenaire rémunérera YANSNET via une prime commerciale fixe pour chaque compte ouvert et validé (par exemple 10 000 FCFA par ouverture). Avec des promotions de plusieurs centaines d'étudiants chaque année, ce pilier représente une manne financière passive extrêmement lucrative.

Pilier 4 : La Data Qualifiée et la Business Intelligence

Le Diagnostic : Lorsqu'une marque de grande consommation souhaite tester le lancement d'un nouveau produit auprès de la cible très convoitée des 18-25 ans, elle mandate des instituts de sondage. Ces enquêtes terrains sont lentes (plusieurs semaines), très onéreuses (plusieurs millions de francs) et la qualité de la donnée récoltée dans la rue est souvent altérée ou falsifiée.

La Solution YANSNET : YANSNET dispose d'un actif rare : un panel de consommateurs 100% authentifié (vérification par SSO Google Workspace de l'école). Si une marque

télécom souhaite évaluer la perception d'un nouveau forfait data, elle rémunère YANSNET (exemple : 500 000 FCFA).

Nous configurons une notification Push contenant un micro-sondage gamifié d'une seule question. En moins de 15 minutes, l'alerte atteint les téléphones de tous les étudiants. Nous fournissons à l'entreprise un rapport de données statistiques en temps réel, purifié de tout biais, segmenté démographiquement. C'est de l'Intelligence de Marché facturée à la demande.

4) Architecte technique et rationalisation des coûts

Le meilleur business model du monde s'effondre si les coûts d'infrastructure (hébergement, bande passante, maintenance) engloutissent les marges. La plus grande innovation de ce projet ne réside pas dans ses fonctionnalités, mais dans son ingénierie d'économie de ressources (Cost-Saving Engineering).

4.1) L'Infrastructure Serveur Zéro Franc (Exploitation des Actifs Locaux)

L'erreur classique des startups technologiques est de louer immédiatement des serveurs de grande capacité chez AWS (Amazon) ou GCP (Google), générant des factures mensuelles croissantes qui asphyxient la trésorerie. Notre stratégie est radicalement différente : nous déploierons le backend (le cerveau de l'application) directement sur les serveurs physiques existants de l'UCAC-ICAM.

L'école disposant déjà d'une alimentation électrique ondulée et d'une connexion internet institutionnelle, le coût d'hébergement matériel marginal pour YANSNET est exactement de 0 FCFA. Ce choix transforme littéralement notre point mort financier

.

4.2. Le Bouclier Algorithmique : L'API AWS Rekognition

Puisque l'hébergement est gratuit, quelle est notre seule dépense d'exploitation (OPEX) ? C'est l'Intelligence Artificielle. Un réseau social universitaire, s'il n'est pas surveillé, peut

dérivé (cyberharcèlement, images inappropriées). La modération humaine est trop lente et légalement risquée. Nous intégrons donc l'API AWS Rekognition.

Comment cela fonctionne ? Lorsqu'un étudiant clique sur 'Publier', l'image n'est pas stockée immédiatement. Elle est envoyée cryptée aux serveurs d'Amazon. En 0,2 seconde, l'IA analyse les pixels. Si elle détecte de la nudité, de la violence, ou des symboles de haine, la publication est détruite automatiquement et l'administrateur est alerté. Le coût de cette assurance tout risque juridique est évalué à environ 183 000 FCFA par mois, une somme dérisoire comparée au coût social et médiatique d'un scandale sur le campus.

5) Projections financières et retour sur investissement (ROI)

Ce chapitre démontre en chiffres comment les 3 740 000 FCFA sollicités pour la création de l'application seront non seulement sécurisés, mais rapidement rentabilisés.

Nous appliquons la méthode Agile 'Lean Startup'. Plutôt que de signer un contrat surévalué de 30 Millions de FCFA avec une agence externe de Douala, nous budgétisons une Task Force interne d'élite. Cette équipe sera rémunérée au prix juste du marché sur un sprint intensif de 5 mois pour livrer le Produit Minimum Viable (MVP).

5.1) Bilan du Semestre 1 (Mois 6 à 12) : L'Atteinte du Point Mort

Dès le lancement officiel au 6ème mois, la stratégie commerciale est d'activer immédiatement le Pilier 1 (La Régie de Publicité Locale de Yansoki). Le point d'équilibre financier (Breakeven) est dérisoirement bas grâce à l'absence de frais d'hébergement. Dès que nous facturons 500 000 FCFA de publicité locale, l'application est en profit.

Catégorie Financière	Détail Mensuel	Justification / Hypothèse	Total Semestre (7 mois)
Chiffre d'Affaires (Pub Locale)	+ 500 000 FCFA / mois	Conversion de 50 commerces à 10 000 FCFA	+ 3 500 000 FCFA

Coût Modération IA (AWS)	- 183 000 FCFA / mois	Sécurisation des médias et protection légale	- 1 281 000 FCFA
Frais Serveur & Bande Passante	0 FCFA	Subventionné via l'infrastructure UCAC-ICAM	0 FCFA
FLUX DE TRÉSORERIE NET (M6-M12)	Excédentaire	Le projet génère déjà du cash-flow positif	+ 2 219 000 FCFA

5.2) Année 2 et 3 : Scalabilité et Remboursement Intégral

L'Année 2 marque le passage à l'échelle. Les grands piliers B2B (Recrutement, Sondages, Banques) sont activés, signant des contrats annuels lourds. Les charges (l'IA d'Amazon) restent quasiment fixes, provoquant un effet de levier massif sur la rentabilité.

Sources de Revenus & Dépenses	Tarification Unitaire (FCFA)	Volume Annuel Estimé	Total Annuel Projeté
Pilier 1 : Régie Pub Locale	10 000 / mois	50 commerces constants	6 000 000 FCFA
Pilier 2 : Recrutement Corporate	1 000 000 / an	3 entreprises (Grand Comptes)	3 000 000 FCFA
Pilier 3 : Affiliation Bancaire CPA	10 000 / compte	200 ouvertures de comptes étudiants	2 000 000 FCFA
Pilier 4 : Sondages Data (Market)	500 000 / campagne	4 campagnes de marques par an	2 000 000 FCFA
CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT ANNUEL	-	-	13 000 000 FCFA

DÉPENSES OPEX (IA Modération AWS)	- 183 000 / mois	Couverture sur 12 mois continus	- 2 196 000 FCFA
MAINTENANCE / DIVERS	- 50 000 / mois	Fonds de roulement technique	- 600 000 FCFA
BÉNÉFICE NET ANNUEL PROJETÉ	-	Couvre 2.7x l'investissement initial	10 204 000 FCFA

6) PLAN D'EXÉCUTION

Développer une application parfaite n'a aucune valeur si personne ne la télécharge. L'histoire du numérique est pavée de cimetières d'applications universitaires désertes. Notre stratégie d'acquisition s'appuie sur la contrainte bienveillante (Lock-In).

6.1) Stratégie du "Verrouillage de Marché" (Lock-In Effect)

L'accès à YANSNET sera barricadé. L'authentification ne passera ni par Facebook, ni par numéro de téléphone, mais exclusivement par l'Active Directory de l'école (le SSO Google Workspace étudiant). Sans l'adresse e-mail se terminant par '@ucac-icam.com', l'application refuse l'accès.

Ce filtre est une forteresse : il supprime instantanément 100% des trolls extérieurs, garantit un climat de confiance total (les étudiants savent qu'ils sont entre eux), et permet de certifier l'authenticité de notre base de données auprès des annonceurs B2B.

6.2) Chronogramme de Lancement Échelonné

- Phase 1 - L'Onboarding Administratif et Logistique (Le Pack de Rentrée - Mois 1) :

Le lancement coïncide stratégiquement avec la rentrée académique, période de stress et de désorganisation maximale pour les nouveaux étudiants (inscriptions, recherche de

salles, emplois du temps fluctuants). YANSNET est présenté par la Direction comme le "Livret d'Accueil Numérique" officiel de l'UCAC-ICAM.

L'application contient les plans du campus de Yansoki, les contacts de l'administration, les règlements intérieurs et les premiers emplois du temps. En numérisant ces démarches lourdes, l'Institution montre l'exemple. L'étudiant installe YANSNET car c'est sa boussole pour survivre à ses premières semaines sur le campus. Le taux d'équipement atteint naturellement 80% sans aucun effort marketing.

- **Phase 2 - Le Relais "Bottom-Up" et la Vie Associative (Mois 2 à 3)** : Une fois l'outil installé pour des raisons administratives (Top-Down), il faut créer de l'attachement émotionnel (Bottom-Up). Nous transférons le pouvoir d'animation aux étudiants eux-mêmes.

L'administration s'efface au profit du Bureau des Étudiants (BDE) et des clubs. YANSNET devient la plateforme exclusive pour gérer la billetterie numérique des événements d'intégration, voter pour l'élection des présidents de clubs (système de sondage sécurisé), et organiser les tournois sportifs. L'application passe d'un statut "institutionnel froid" à un statut "communautaire chaud". L'étudiant y va désormais pour interagir avec ses pairs et participer à la vie sociale du campus.

- **Phase 3 - L'Ancrage Territorial et Économique (Mois 4 à 5)** : Maintenant que l'habitude d'ouverture quotidienne est créée, nous déployons la dimension locale. L'étudiant a pris ses marques et cherche à optimiser son quotidien à Yansoki. Nous activons la cartographie interactive des services autour du campus (Pilier 1 du modèle économique).

L'application référence les bons plans de proximité : le menu du jour des restaurants partenaires, les horaires du pressing, les tarifs du secrétariat d'en face. En centralisant cette micro-économie locale, YANSNET devient un outil de productivité quotidienne. L'application fait gagner du temps et de l'argent aux étudiants, tout en digitalisant le commerce de quartier de Yansoki.

- **Phase 4 - L'Émulation Pédagogique et le Tutorat (Mois 6 à 7)** : À l'approche des premières périodes d'examens (partiels), l'angoisse académique monte. L'application déploie alors ses modules collaboratifs. YANSNET devient un espace d'entraide (*Peer-to-Peer*). Les étudiants d'années supérieures peuvent proposer des séances de tutorat rémunérées ou bénévoles aux plus jeunes. Les délégués créent des groupes de révision par matière pour partager des fiches de synthèse. L'application prouve ici sa valeur ajoutée intellectuelle : elle n'est plus seulement un réseau social ou un outil administratif, elle devient un véritable partenaire de réussite académique qui limite les taux d'échec.

- **Phase 5 - Le Tremplin Carrière et l'Ouverture Corporate (Mois 8 et au-delà)** : La dernière phase vient couronner le cycle de vie de l'étudiant, lorsqu'il doit chercher un stage ou s'insérer professionnellement. Nous activons le module B2B Entreprises. Les multinationales partenaires accèdent à la plateforme pour publier des offres exclusives, animer des webinaires de présentation métier, ou proposer des entretiens virtuels directement sur YANSNET.

- L'étudiant réalise que tout son parcours numérique sur l'application (ses engagements associatifs de la Phase 2, son tutorat de la Phase 4) constitue désormais un portfolio valorisable auprès des recruteurs. L'application devient son premier réseau professionnel, assurant une rétention totale même après l'obtention de son diplôme (Alumni).

7) Conclusion générale et appel à la décision

Le projet YANSNET transcende la simple notion de projet informatique étudiant. Il représente un alignement paradigmatique parfait entre trois sphères critiques : un enjeu d'utilité publique majeur (sécuriser physiquement et psychologiquement les étudiants

navigants dans la zone complexe de Yansoki), une nécessité institutionnelle absolue (centraliser, maîtriser et assainir une communication officielle actuellement désintégrée), et une opportunité de rentabilité économique hors normes grâce à un modèle B2B novateur monétisant l'accès au marché étudiant.

La force magistrale et incontestable de ce dossier stratégique repose sur sa sobriété technique et son ingéniosité. En refusant les solutions d'hébergement cloud standardisées et ruineuses au profit de l'infrastructure dormante de l'UCAC-ICAM, et en bridant de manière draconienne, nous avons accompli l'exploit de réduire les coûts d'exploitation marginaux à un montant insignifiant. La seule charge financière mensuelle (183 000 FCFA) est allouée à l'Intelligence Artificielle d'Amazon, garantissant une protection juridique infaillible de l'institution.

Les projections financières, bâties sur des hypothèses d'acquisition commerciales volontairement prudentes et pessimistes, démontrent qu'un investissement initial de développement chirurgicalement maîtrisé de 3 740 000 FCFA est capable d'atteindre son point mort en moins de 6 mois. Mieux encore, la structure des coûts fixes transformera mécaniquement l'écrasante majorité des revenus publicitaires et partenariaux en marge nette, générant un bénéfice annuel projeté dépassant les 10 Millions FCFA à compter de la deuxième année d'exploitation. Cet argent pourra être réinvesti dans le matériel pédagogique de l'école ou dans les bourses associatives.

Le risque d'inaction est aujourd'hui supérieur au risque d'investissement. Laisser le statut quo perdurer, c'est accepter la dispersion de l'information et renoncer à la monétisation légitime de l'écosystème étudiant.

C'est pourquoi nous vous recommandons formellement l'approbation et le déblocage immédiat de l'enveloppe budgétaire de 3,74 Millions de FCFA, afin de déclencher sans délai le recrutement de la cellule de développement et d'entamer la production du code source du projet YANSNET.

V. Gestion de la qualité

1. Niveau application

1.1 Qualité et sécurité des données

Critères d'acceptation	Respecté ? (Oui / Non)	Commentaires / Preuves
Chiffrement des données de bout en bout implémenté.	Non	/
Protection contre les attaques d'injection connues (SQL, NoSQL, XSS) validée.	Non	/
Le modèle d'IA pour la censure supprime les médias pornographiques ou haineux avant publication (en moins de 7s).	Non	/
Respect des limites de taille (Photo 3Mo, Vidéo 20Mo, Fichiers Groupe 50Mo).	Non	/
Plan de Sauvegarde et Plan de Reprise d'Activité (PRA) validés par l'équipe Réseau.	Non	/
Suppression ou archivage effectif des données lors de la suppression d'un compte utilisateur.	Non	/

1.2 Qualité des performances

Critères d'acceptation	Respecté ? (Oui / Non)	Commentaires / Preuves
Délai de chargement (fil d'actualité, profil, abonnés, recherche) inférieur ou égal à 3 secondes.	Non	/
Délai d'exécution (ouverture app, envoi DM, abonnement) inférieur ou égal à 2 secondes.	Non	/
Délai de publication (photo/vidéo) inférieur ou	Non	/

égal à 7 secondes (incluant la vérification IA).		
Le serveur supporte une charge de 125 000 utilisateurs simultanés (scalabilité vérifiée).	Non	/
Le taux de disponibilité mesuré de l'application est supérieur à 97%.	Non	/

1.3 Qualité technique système

Critères d'acceptation	Respecté ? (Oui / Non)	Commentaires / Preuves
Authentification SSO opérationnelle via l'Active Directory (comptes Google de l'université).	Non	/
L'application reste accessible et fonctionnelle en cas de connexion limitée (réseau LAN de Yansoki).	Non	/
La matrice des droits pour les rôles et fonctionnalités est rigoureusement respectée par le système.	Non	/
Le déploiement des mises à jour progressives via le réseau de l'institut fonctionne correctement.	Non	/
Tous les livrables techniques (BPMN, MCD, Architecture logicielle/technique, Dictionnaire) sont fournis.	Oui	/
Tous les tests (unitaires, intégration, système, acceptation) ont été exécutés avec succès.	Non	/

1.4 Qualité fonctionnelle

Critères d'acceptation	Respecté ? (Oui / Non)	Commentaires / Preuves
Les publications globales et prioritaires de l'UCAC-	Oui	/

ICAM s'affichent correctement en tête de fil.		
Le workflow de publication complet (photo/vidéo, légende, tags ^tag, localisation) est opérationnel.	Oui	/
Les interactions (Likes via bouton ou triple tap, commentaires type Instagram) fonctionnent et s'affichent instantanément.	Oui	/
La modération participative (signalement et suppression de commentaires inappropriés) est active.	Non	/
La messagerie directe (DM) et les groupes (privés par résidence/promo et publics) fonctionnent sans échec.	Oui	/
Les notifications de nouvel abonnement sont envoyées silencieusement.	Non	/

1.5 Qualité de l'application mobile

Critères d'acceptation	Respecté ? (Oui / Non)	Commentaires / Preuves
L'application est disponible, installable et stable sur iOS et Android.	Non	/
L'interface utilisateur est jugée intuitive, moderne (standards Big 4) et sans ralentissements par les testeurs.	Non	/
Le panel des 24 bêta-testeurs a validé les workflows principaux (inscription, publication, DM).	Non	/
Les ajustements suite aux retours des bêta-testeurs ont été implémentés (tests post-correction validés).	Non	/

Blocage effectif de la connexion simultanée sur plusieurs appareils pour un même compte (Phase 1).	Non	/
--	------------	---

2. Niveau livrable

2.1 Checklist

Cette check-list doit être vérifiée en interne avant toute soumission d'un livrable.

Catégorie	Point de contrôle	Vérifié (Oui/Non)	Commentaires
Complétude	Toutes les sections exigées par le cahier des charges sont présentes.	Non	/
Complétude	Les annexes, sources et liens de traçabilité sont intégrés.	oui	/
Cohérence	La terminologie est homogène entre les différents modèles (ex: UML, BPMN et SRS).	oui	/
Cohérence	Les données financières et temporelles (Ms Project, Courbe en S) sont alignées.	oui	/
Conformité	Le livrable respecte les standards exigés (RGPD, ISO, IEEE, BPMN).	oui	/
Conformité	Le format de livraison correspond à la demande (PDF, maquette interactive).	oui	/

2.2 Matrice de critères de validation par livrable

Ce tableau définit contractuellement comment chaque livrable spécifique est validé.

ID	Nom du Livrable	Critères de qualité / Acceptation	Méthode de vérification	Validateur
L1	Personas & Cartes d'empathie	Basés sur des interviews réelles (au moins 1 expert). Cibles bien définies.	Revue de pertinence avec le partenaire	Équipe Pédagogique / Partenaire
L2	Cartographie BPMN & Diagrammes UML	Flux opérationnels clairs, justification des choix d'outils, norme BPMN respectée.	Revue par les pairs / Validation technique	Tuteur technique
L3	Document de spécifications (SRS)	Exigences tracées, classées (F/NF/Contraintes) avec critères d'acceptation.	Revue documentaire et grille IEEE	Équipe Pédagogique
L4	WBS & Planning (Gantt, PERT)	Découpage exhaustif, dépendances claires, respect du calendrier ETSIA.	Comparaison avec la Baseline	Chef de Projet / Tuteurs
L5	Modèle éco & Budget (Courbe S)	Estimation réaliste, ROI défini, Business Plan cohérent.	Revue financière	Tuteur / Partenaire
L6	Matrices Projet (RACI, Com, Risques)	Rôles clairs, plans de mitigation (réponse aux risques) définis.	Revue de management de projet	Équipe Pédagogique
L7	Maquettes de validation	Conformes aux exigences UI/UX, validation des flux par les utilisateurs.	Tests utilisateurs / Démonstration	Partenaire / Utilisateurs finaux

VI. Gestion des ressources humaines

La gestion des ressources humaines de ce projet repose sur une organisation structurée visant à transformer les recommandations du bilan MVP en solutions opérationnelles pour le campus de Yansoki.


Ce volet définit l'écosystème de collaboration en présentant d'abord notre **partenaire institutionnel** (l'UCAC-Icam) et ses attentes, suivi de l'**organigramme fonctionnel** qui

répartit les membres du Groupe 15 selon leurs domaines d'expertise technique et organisationnelle.

Enfin, l'utilisation d'une **matrice RACI** assure la clarté de la gouvernance en attribuant des responsabilités précises pour chaque tâche critique, garantissant ainsi la traçabilité et l'efficacité indispensables à la réussite de la soutenance et du déploiement final.

Tâches	July Makongne (Data analyst/engineer)	Loic Nankap(Data analyst)	Joseph Nkoulou (Data analyst /engineer)	Lionel Tofa (Réseau)	Steven NounGoua(Reseau)
Analyse & exigences	A	R	C	C	I
Réaliser le recueil des besoins	A	C	C	I	C
Modéliser le système	A	C	C	R	I
Concevoir les maquettes / schémas visuels	C	C	R	R	C
Construire la checklist de validation des exigences	C	R	C	C	I
Élaborer la matrice de traçabilité	C	A	R	C	C
Organiser le backlog Jira et le suivi Scrum	R	I	I	I	I
Planification du projet (GANTT, PERT)	C	C	C	C	R
Budgétisation et analyse financière	I	I	C	R	I
Développement & reprise du code	C	R	C	C	C
Gestion des parties prenantes et des risques	C	C	R	C	I
Gestion des approvisionnements	I	R	C	C	I
Tests & qualité	A	C	C	C	I

Matrice RACI

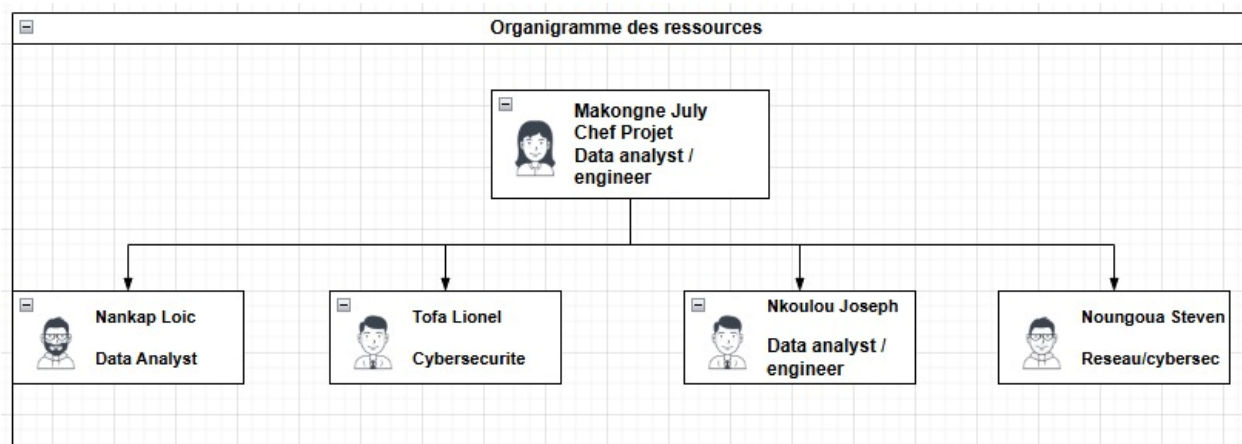

Organigramme des ressources humaines

VII. Gestion des communications

La réussite de **YANSNET** repose sur une circulation fluide et sécurisée de l'information entre l'équipe projet, l'administration de l'UCAC-Icam et les étudiants du campus de Yansoki.

Pour garantir la transparence et l'adhésion de tous, nous avons établi une **Matrice de Communication**. Cet outil définit précisément **qui** doit être informé, **pourquoi**, **par quel canal** (Confluence, Moodle, réunions) et à quelle **fréquence**.

Elle permet notamment de rassurer les parties prenantes sur la levée des risques critiques (Sécurité, SSO, Modération) identifiés lors du bilan MVP.

Matrice de communication									
Objet de la communication	Canal / Outil	Fréquence	Participants	Responsable	Séance	Objectif	Date	Livrable associé	
Daily Stand-up (Suivi opérationnel)	Présentiel	Quotidien	Toute l'équipe	July Makongne	Lancement (Kick-)	Cadrage de la portée (Inclus/Exclus)	Jour 1	WBS	
Revue de Conception (Validation UML/SRS)	Présentiel	Une fois réaliser	Toute l'équipe	Lionel Tofa	Atelier Analyse	Revue du bilan MVP et SRS	Jour 2	Document SRS	
Comité de Pilotage (Point Partenaire)	Présentiel	1 fois / semaine	Équipe + Partenaire	Teams	Atelier Technique	Validation des diagrammes et maquettes	Jour 3	Dossier de modélisation	
Gestion Documentaire (Versions PDF/Jira)	Drive	Continu	Toute l'équipe	Joseph Nkoulou	Revue Qualité	Vérification de la traçabilité et des tests	Jour 4	Matrice de traçabilité	
Alerte Risques (Urgences techniques)	WhatsApp	Immédiat	Membres concernés	Loic Nankap	Clôture & Répétition	Finalisation du PDF et répétition soutenance	Jour 5	Plan Projet Complet	

VIII. Gestion des parties prenantes

Le succès de **YANSNET** ne dépend pas seulement de la qualité du code, mais de notre capacité à satisfaire des acteurs aux attentes parfois divergentes. Entre l'administration de l'UCAC-Icam, soucieuse de la sécurité, et les étudiants, demandeurs de fluidité, nous avons cartographié chaque profil pour adapter notre stratégie.

La **matrice Influence x Intérêt** ci-dessous nous sert de boussole stratégique : elle nous permet de concentrer nos efforts sur les décideurs critiques (DSI, tuteurs pédagogiques) tout en mobilisant nos "défenseurs" (bêta-testeurs) pour garantir que le déploiement soit une réussite partagée. Notre stratégie de communication repose sur des validations aux moments clés (jalons) pour confirmer la levée des points bloquants du MVP.

Partie Prenante	Role	Implication dans la V2
UCAC-ICAM / Administration	Commanditaire	Valider les nouvelles exigences, autoriser le déploiement du module IA et du système d'alerte.
Pere BOSSOU Maximilien	Encadrant / Product Owner	Arbitrer les priorités V2, valider les livrables, superviser les tests d'acceptation.
Equipe Développement / Groupe 15	Realisation	Implementer l'ensemble des nouvelles exigences, corriger les anomalies MVP, livrer la V2.
Equipe Data	IA & Données	Developper et deployer les modeles d'analyse sentimentale et de censure avancée.
Equipe Réseau & Telecom	Infrastructure	Deployer le réseau LAN d'alerte, valider la scalabilité, livrer le PRA.
Etudiants UCAC-ICAM	Utilisateurs finaux	Participer aux tests beta V2, donner leurs retours sur les nouvelles fonctionnalités.

IX. Gestion des risques

Registre des risques et plan de réponse

Le registre détaillé ci-après constitue notre feuille de route opérationnelle. Pour chaque menace, nous avons défini des actions préventives pour réduire la probabilité et des actions correctrices pour limiter l'impact en cas de réalisation.

REGISTRE DES RISQUES										
ID	Nature de risque	Description	Gravité (1-5)	Prob. (0-1)	Criticité (0-5)	Niveau	Conséquence si avéré	Responsable	Actions préventives	Actions correctrices
R1	Sécurité	Intrusion de comptes hors domaine @ucac-icam.com	5	0.8	4.0	Critique	Flicage des étudiants, spam, harcèlement.	Loïc	Liaison AD/Google SSO obligatoire.	Blocage IP et purge des comptes.
R2	Éthique	Publication de contenus inappropriés (Haine/Nudes)	5	0.7	3.5	Critique	Fermeture administrative de l'appli par l'école.	Lionel	API de censure IA automatique (ES-005).	Suppression manuelle par modérateur.
R3	Performance	Latence du Fil d'actualité > 5 secondes	3	0.9	2.7	Moyen	Abandon massif de l'application (Désinstallation).	Joseph	Optimisation du cache et des requêtes SQL.	Redémarrage service et purge cache.
R4	Exploitation	Crash serveur sans sauvegarde (Pas de PRA)	5	0.3	1.5	Élevé	Perte totale des données et du travail.	July	Script de backup auto quotidien (ET-009).	Restauration via backup J-1.
R5	Matériel	Surchauffe du serveur central sur le campus	4	0.4	1.6	Élevé	Arrêt brutal du service Yansnet.	Joseph	Installation dans un local ventilé/climatisé.	Migration temporaire sur Cloud/Host.
R6	Adoption	Taux d'utilisation < 60% des étudiants	4	0.5	2.0	Moyen	Projet considéré comme un échec (ROI nul).	Lionel	Campagne de com' via les délégués.	Ajout de fonctions "utiles" (Menu, Notes).
R7	Légal	Stockage de données personnelles non chiffrées	4	0.4	1.6	Élevé	Poursuites judiciaires en cas de fuite.	Teddy	Chiffrement au repos (AES-256) (ES-002).	Signalement à l'administration/Changement clés.
R8	Réseau	Défaillance de la fibre optique campus	3	0.6	1.8	Moyen	Appli inaccessible depuis l'extérieur.	Joseph	Mode dégradé LAN uniquement (ET-006).	Utilisation d'un routeur 4G de secours.
R9	Gouvernance	Conflit entre modérateurs (abus de pouvoir)	3	0.5	1.5	Moyen	Révolte des étudiants, sentiment d'injustice.	July	Validation de la Matrice des Droits (EF-007).	Retrait des droits au modérateur faulif.
R10	Technique	Bugs sur les téléphones bas de gamme (Android v6/7)	3	0.7	2.1	Moyen	Exclusion d'une partie des étudiants.	Loïc	Tests sur émulateurs versions anciennes.	Version "Lite" de l'interface web.
R11	Infrastructure	Saturation de l'espace disque (Vidéos 4K)	3	0.8	2.4	Moyen	Impossibilité de poster de nouveaux contenus.	Teddy	Limite de 50 Mo par fichier (Scénario 5).	Nettoyage des fichiers temporaires.
R12	Projet	Retard de livraison des corrections P1	4	0.6	2.4	Élevé	Soutenance ratée, note pénalisée.	July	Planning GANTT strict et réunions J-2.	Réduction du périmètre (Drop V2).
R13	Utilisation	Usurpation d'identité d'un prof ou délégué	5	0.5	2.5	Critique	Fausse information, désordre sur le campus.	Loïc	Marqueur visuel "Vérifié" (EF-012).	Bannissement et vérification manuelle ID.
R14	Santé	Harcèlement en messages privés (DMs)	4	0.6	2.4	Élevé	Risques psychosociaux pour les victimes.	Lionel	Bouton "Signaler" et blocage utilisateur.	Intervention des tuteurs/administration.
R15	Technique	Échec des mises à jour OTA (Over-The-Air)	2	0.4	0.8	Faible	Version d'appli différente selon les élèves.	Teddy	Tests sur pipeline CI/CD (ET-007).	Envoi de lien de téléchargement direct.

Registre des risques

Matrice des risques

Chaque risque a été évalué selon sa **Probabilité** d'occurrence et sa **Gravité** (Impact). La matrice ci-dessous met en évidence nos priorités absolues : la sécurisation des accès

(SSO/AD), la modération des contenus (Censure IA) et la stabilité du réseau LAN. Les risques situés dans la zone rouge font l'objet d'une surveillance prioritaire par l'équipe projet.

MATRICE DES RISQUES					
Probabilité / Gravité	1. Faible	2. Mineure	3. Modérée	4. Majeure	5. Critique
0.8 - 1.0 (Très Forte)			R3, R11		R1
0.6 - 0.7 (Forte)			R8, R10	R12, R14	R2
0.4 - 0.5 (Moyenne)		R15	R9	R5, R6, R7	R13
0.1 - 0.3 (Faible)					R4

Matrice des risques

X. Gestion de l'approvisionnement

Besoins matériels et logiciels

Ressource	Type	Justification	Delai d'acquisition	Cout (FCFA)
Serveur VPS cloud (dev)	Materiel	Environnement de developpement et de test isole.	Semaine 1	175 000
Serveur de production scalable	Materiel	Hebergement de la V2 en production avec auto-scaling.	Semaine 10 (avant tests de charge)	350 000
Serveur local LAN Yansoki	Materiel physique	Hebergement du systeme d'alerte SOS independant d'Internet.	Semaine 8 (avant phase SOS)	250 000
GPU cloud (entrainement IA)	Service cloud	Entrainement du modele d'analyse sentimentale.	Semaine 7 (avant phase IA)	320 000
Stockage CDN medias	Service cloud	Distribution des photos, videos, stories.	Semaine 1	105 000
Certificat SSL + nom de domaine	Service	Chiffrement TLS 1.3 en production.	Semaine 10	30 000
Jira (gestion de projet)	Logiciel	Backlog, Scrum/Kanban, suivi des taches.	Semaine 1 (plan etudiant gratuit)	0
Confluence (documentation)	Logiciel	Documentation collaborative, versioning, partage.	Semaine 1 (plan etudiant gratuit)	0

Draw.io / LucidChart	Logiciel	Diagrammes WBS, GANTT, PERT, BPMN, MCD.	Semaine 1 (gratuit)	0
SonarQube (qualite code)	Logiciel	Analyse statique du code, couverture de tests.	Semaine 11 (open-source)	0
JMeter (tests de charge)	Logiciel	Simulation de 125 000 utilisateurs simultanes.	Semaine 11 (open-source)	0
Appareils de test iOS + Android	Materiel	Tests de compatibilite et d'utilisabilite.	Semaine 1 (prets par l'ecole)	0

Contraintes et delais d'approvisionnement

- **Serveur LAN Yansoki** : son acquisition et son installation doivent etre finalisees avant la **semaine 8**, date de debut du developpement du systeme SOS. Ce livrable est sous la responsabilite de l'equipe Reseau & Telecom.
- **GPU cloud** : la reservation de la capacite de calcul doit etre effectuee en semaine 7 pour ne pas bloquer l'entrainement du modele IA.
- **Validation ethique IA** : le dossier de validation doit etre soumis a la direction de l'UCAC-ICAM en semaine 1 pour obtenir l'approbation avant la semaine 10.
- **Budget** : l'enveloppe budgetaire doit etre validee par l'administration avant le debut du projet (avant la semaine 1).

Logiciels gratuits / open-source : priorite donnee aux outils gratuits (Jira, Google colaboration, visual paradigm) pour minimiser les couts.

XI. Gestion du changement

Processus de gestion du changement

Tout changement au perimetre, au planning, au budget ou aux specifications du projet YANSNET V2 doit suivre le processus formel ci-dessous. Aucune modification ne peut etre implementee sans avoir ete analysee, approuvee et documentee.

Etape	Action	Responsable	Outil	Delai max
1 Demande	Tout membre de l'equipe ou partie prenante soumet une demande de changement (formulaire Jira) decrivant la nature du changement, la justification et les impacts pressentis.	Demandeur	Jira – ticket Change Request	Immediate

2 Analyse	Le chef de projet realise une note d'analyse d'impact couvrant : perimetre, planning (GANTT), budget (courbe en S), qualite et risques associes.	Chef de projet	Google docs – Note d'impact	48 h
3 Decision	La note d'impact est soumise au partenaire (Pere BOSSOU Maximilien) pour decision : Approuve / Refuse / Reporte.	Pere BOSSOU	Email + validation	72 h
4 Integration	Si approuve : mise a jour du SRS V2, du WBS, du GANTT, du budget et du registre des risques. Affectation des ressources necessaires.	Chef de projet + equipe	Google docs + Jira	Apres decision
5 Communication	Notification formelle a toutes les parties prenantes concernees. Archivage du changement dans le registre des modifications.	Chef de projet	Email + Google docs	Immediate apres integration

XII. Gestion de l'intégration

La gestion de l'integration assure la coherence globale du projet en articulant l'ensemble des domaines du plan projet. Elle garantit que toutes les parties travaillent vers un meme objectif, avec des informations a jour et partagees.

Vision et objectifs du projet

Vision : faire de YANSNET la reference numerique de la communaute UCAC-ICAM – un espace de communication, de soutien mutuel et d'information officielle, accessible a tous les etudiants depuis le campus de Yansoki jusqu'aux anciens diplomes.

Objectif	Indicateur	Cible
Corriger tous les blocages P1 identifies dans le bilan MVP	Nombre d'exigences bloquantes resolues	12 / 12
Livrer les nouvelles fonctionnalites V2	Taux de completion des Must Have	100 %
Atteindre la scalabilite cible	Utilisateurs simultanes valides en tests de charge	125 000
Respecter le budget	Ecart budget reel / budget planifie	<= 10 %
Respecter le planning	Date de livraison finale	S14 – 09 octobre 2026

Satisfaire les utilisateurs	Score SUS UAT V2	>= 75 / 100
-----------------------------	------------------	-----------------------

Tableau de bord de pilotage – Coherence des sections

Ce tableau garantit la coherence entre les sections du plan projet.

Section	Livrable cle produit	Alimente	Statut
1. Portee	WBS, perimetre inclus/exclu	GANTT (S2), RACI (S5), Risques (S8), Changement (S10)	COMPLETE
2. Duree	GANTT 14 semaines, PERT, chemin critique	Couts/courbe S (S3), Risques (S8), Integration (S11)	COMPLETE
3. Couts	Budget previsionnel, Business Plan, ROI, Courbe en S	Approvisionnement (S9), Integration (S11)	COMPLETE
4. Qualite	Check-list livrables, matrice de validation	Tests (GANTT S2), Risques R6 (S8)	COMPLETE
5. Ressources RH	RACI, organigramme, roles	Communications (S6), Risques R8 (S8)	COMPLETE
6. Communications	Matrice de communication, tableau reunions	Parties prenantes (S7), Integration (S11)	COMPLETE
7. Parties prenantes	Matrice Influence x Interet, strategie	Communications (S6), Risques (S8)	COMPLETE
8. Risques	Matrice des risques, registre, plans de reponse	Changement (S10), Integration (S11)	COMPLETE
9. Approvisionnement	Tableau des besoins, contraintes et delais	Couts (S3), Planning (S2)	COMPLETE
10. Changement	Processus formel, note d'impact, exemple post-MVP	SRS V2, Bilan MVP (X3), Portee (S1)	COMPLETE
11. Integration	Vision, objectifs, tableau de bord, coherence	Toutes les sections	COMPLETE

La cohérence entre les sections est garantie par : la centralisation sur **google docs**, les revues hebdomadaires de l'équipe, les validations aux jalons par le commanditaire, et le suivi continu dans **Jira**. Toute modification dans une section déclenche automatiquement la mise à jour des sections impactées via le processus de gestion du changement.
